

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

IUT DE VILLETANEUSE

Département Informatique

SAE 205 : Gestion de projet

RAPPORT DE SYNTHÈSE :

Groupe MARS

Hamza EL BOUBAKRI

Anass FATHI

Destinataire : M. ISSEKI

Sous la direction de : M. ISSEKI

Date de rendu : 27/03/2026

Table des Matières

I - Cadre du projet et compréhension du cas	page 3
II –Analyse des besoins et du périmètre du projet	page 3
III – Objectifs du projet et livrables attendus	page 6
IV – Acteur du projet , organisation et gouvernance	page 9
V – V - Répartition des rôles et responsabilité (RACI)	page 11
VI – Découpage du projet en tâches (WBS)	page 13
VII - Planification du projet et dépendances	page 14
VIII - Budget prévisionnel et arbitrages réalisés.....	page 17
IX - Analyse des risques et modalités de suivi.....	page 19
X- Bilan prévisionnel et retour réflexif	page 22
XI - Contribution individuelle et prise de recul personnelle.....	page 23

I - Cadre du projet et compréhension du cas

Notre projet se lance sur les bases d'une volonté de l'université de renforcer ses actions en faveur du numérique responsable. Dans cette démarche, la direction de l'IUT a exprimé le souhait d'organiser une journée dédiée aux enjeux du numérique responsable intitulée “ *Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants* ”. Cet événement sera ouvert aux étudiants mais aussi au grand public universitaire.

Cette démarche nous place en tant qu'équipe projet pour organiser cet événement. Notre équipe, présentée par Anass Fathi et Hamza EL BOUBAKRI, a pour responsabilité d'organiser, coordonner, planifier et arbitrer cet événement. Par cela, notre équipe devra respecter les contraintes liées en partie aux ressources et au budget, aux délais et à la qualité de cet événement.

Enfin, le point névralgique de notre équipe est de pouvoir apporter une solution et un plan d'organisation stable afin que cette journée du jeudi 14 mai 2026 se passe dans les meilleures conditions et que le contenu abordé lors de celle-ci soit des plus aboutis et amène à changer la façon d'agir des participants sur nos responsabilités numériques.

II –Analyse des besoins et du périmètre du projet

A - les besoins identifier

Maintenant, une étape importante pour notre projet consiste à identifier les besoins pour cet événement. Un besoin, c'est quelque chose à résoudre ou à améliorer. On va différencier les besoins exprimés des besoins réels. L'objectif principal est de sensibiliser les étudiants aux enjeux du numérique durable. Pour le bon déroulement de cet événement, on va prendre en compte différentes dimensions qui sont académique, institutionnelle et professionnelle. C'est pour offrir à ceux qui sont concernés, une vision globale sur le numérique responsable.

B - les contraintes majeur

Le pilotage du projet est bien encadré par les trois piliers de la structure Qualité, Coût, Délai. Sur le plan financier, nous devons composer avec une enveloppe budgétaire maximale de 2 000 euros. La contrainte de coût nous impose des arbitrages, notamment dans le choix des intervenants ou des lots, afin de garantir

la Qualité et la crédibilité de l'événement sans dépasser les ressources allouées par la MOA (Direction de l'IUT).

Le Délai constitue notre contrainte la plus forte, avec une échéance qui n'est pas négociable fixée au jeudi 14 mai. Pour sécuriser ce calendrier, nous avons intégré des délais de validation préalable pour chaque étape de communication. Notre objectif est de stabiliser les décisions le plus tôt possible : en anticipant ces validations, nous conservons une capacité d'action maximale tout en évitant des modifications tardives qui seraient coûteuses et risquées pour le projet.

Sur le plan opérationnel, la réussite de la journée dépend de fortes dépendances externes, notamment la disponibilité des parties prenantes. N'ayant pas d'autorité hiérarchique sur l'intervenant (animateur numérique) ni sur les services logistiques, la coordination de leurs agendas est un point de vigilance majeur. De même, la disponibilité matérielle et les prérequis techniques, comme la stabilité de la connexion Wi-Fi pour les outils interactifs (type Kahoot), sont identifiés comme des ressources critiques pour atteindre nos objectifs de sensibilisation.

Enfin, pour répondre aux exigences de l'université, nous veillons au strict respect de la charte graphique institutionnelle, gage de sérieux pour le public étudiant. Pour faire face aux aléas inhérents à tout projet inédit, nous avons intégré des marges de sécurité dans notre planification. Cette approche nous permet de protéger notre chemin critique et d'assurer la livraison des livrables (ateliers, conférences) dans les conditions de performance attendues par le commanditaire.

C - Le périmètre

A présent, nous allons délimiter le périmètre du projet en identifiant les personnes concernées par cette sensibilisation. Pour le périmètre inclus, on a les étudiants de l'ensemble de l'université ainsi que le corps enseignant. Nous avons choisi d'intégrer également le personnel administratif et aussi "professionnel", car ils ont de l'impact au sein de l'établissement.

À l'inverse, on a fait le choix d'exclure les personnes extérieures n'étant ni inscrites, ni employées par l'université.

D - Les parties prenantes

L'analyse des parties prenantes est une étape clé pour notre pilotage de projet. En effet, notre équipe, Anass Fathi et Hamza EL BOUBAKRI assurera le bon fonctionnement et l'organisation de ce projet. Notre tâche consistera à organiser, coordonner, planifier et arbitrer cet événement. Le bon fonctionnement de cet événement se concrétisera sur le travail apporté par nos parties prenantes.

En commençant par la Direction de l'IUT, le Service Communication et le Service Logistique. Des piliers quant à la réalisation de cet événement. En effet, la grande majorité des décisions importantes, mais aussi la disponibilité du matériel et du budget seront accordées par ces entités . Nous devons aussi faire attention aux contraintes liées à ces entités avec de par un respect de la charte graphique et notamment d'une validation en amont .

En suivant les préceptes de la matrice pouvoir / intérêt, nous allons maintenant nous intéresser aux parties prenantes qui ont un pouvoir moindre mais un grand intérêt pour notre projet. Cette partie est représentée par des éléments tels que les enseignants, les associations étudiantes et aussi les partenariats externes.

Ces parties sont aussi cruciales à la bonne mise en scène de notre projet. En effet, ces entités, caractérisées par leur forte implication au projet de part la réalisation même de notre sensibilisation au numérique responsable apporteront une expertise à celle-ci. Ainsi, les contraintes liées à ces entités sont leur disponibilité ou encore un coût budgétaire lié notamment aux experts externes.

Enfin, ces parties prenantes sont liées par de fortes interdépendances. Notre équipe de pilotage devra donc se munir de décisions réfléchies, car celles-ci pourront être irréversibles.

E - Bénéficiaire

Ensuite, nous avons identifié l'ensemble des bénéficiaires de ce projet. Les premiers bénéficiaires sont les étudiants de l'université, qui profiteront directement de toute cette sensibilisation et des échanges. Toutefois, l'impact de l'événement s'étend aussi vers le personnel de l'établissement, c'est -à -dire qu'on inclut le corps enseignant et les services administratifs (secrétariats) etc, car il faut que le plus de personnes agissent pour qu'il y ait un réel changement.

F - Exigence fonctionnelle

Les exigences fonctionnelles de notre projet décrivent ce que l'événement permet d'offrir pour répondre aux besoins. Le principal but est de sensibiliser les étudiants pour mettre en place un réel changement de comportement dans leurs usages numériques de tous les jours. Ce n'est pas de la simple information, l'événement doit vraiment encourager l'adoption de gestes responsables. Pour s'assurer du respect de ces exigences, nous prévoyons de mettre en place des petits jeux pour vérifier que les participants ont bien retenu les bonnes pratiques.

G - Exigence non-fonctionnelle

Les exigences non-fonctionnelles se basent sur les conditions dans lesquelles le projet doit marcher. Il faut donc prendre en compte les contraintes liées à la qualité, aux délais, aux coûts(budget), mais aussi être conforme par rapport aux attentes de la direction de l'IUT.

L'un des points majeurs des exigences non-fonctionnelles est dans la cohérence institutionnelle, en passant par le respect de la charte graphique et la validation préalable en amont de nos actions et de nos messages diffusés. Ces mesures vont encadrer notre projet afin qu'il soit adapté à tout usager de notre événement.

La procédure de mise en œuvre de notre projet est restreinte par le budget max de 2 000 euros pour l'ensemble de l'événement. Nous devons donc optimiser chacune de nos dépenses pour rentrer dans notre budget tout en proposant un événement qualitatif. Cela passe par une phase de planification de la communication, de la logistique, etc...

Nous devons pour cela prendre en compte l'accès aux lieux et planifier de possibles aménagements pour faciliter l'accessibilité au site, mais aussi permettre la captation d'un plus grand public. Cette accessibilité ne se présente pas seulement sous la forme physique, mais aussi par l'adaptation d'une infrastructure de qualité, avec notamment l'accès au Wi-Fi pour pouvoir par la suite, à travers un kahoot, étendre notre événement à un public plus large.

Enfin, ces exigences non-fonctionnelles sont primordiales pour définir le cadre dans lequel nous allons devoir jongler entre le coût, le délai et la qualité.

III – Objectifs du projet et livrables attendus

La concrétisation de notre projet passe par un bon pilotage de celui-ci .C'est pourquoi, pour l'accomplissement de cette journée dédiée au numérique responsable nous nous devons de définir des objectifs clairs, afin qu'aucune ambiguïté ne puisse paraître lors de la réalisation de celui-ci .Dans cette optique nous mettons en place une hiérarchie des objectifs en fonction de leur importance .En effet tous ces objectifs n'ont pas le même poids .C'est dans cette vision que nous avons défini ces objectifs en trois catégories.

Les premiers sont les objectifs dits stratégiques , ils définissent la finalité du projet .S'en suivent les objectifs opérationnels qui définissent eux les résultats concrets attendus .Enfin la dernière catégorie dans laquelle ces objectifs peuvent être classés sont les objectifs secondaires qui sont pour la plupart des compléments du projet pour ainsi bonifier l'ensemble du projet.

A - Méthode , Objectif SMART

Ces objectifs sont ainsi hiérarchisés mais aussi détaillés suivant la méthode SMART, acronyme des mots : Spécifique , l'objectif définit précisément ce qui doit être fait . Mesurable , il permet d'évaluer la qualité et la quantité précisément . Acceptable , l'objectif doit être atteignable et réalisable . Réaliste , il est envisageable dans le cadre des ressources logistiques et financières . Temporellement défini , l'objectif est défini et délimité.

Cette méthode combinée à la hiérarchisation permet d'acquérir des objectifs clairs et précis .En effet un objectif SMART réduit les incertitudes dues à de mauvaises interprétations qui peuvent impacter fortement la réalisation du projet. Concrètement, notre objectif est de tenir un stand d'animation en continu pendant 3 heures (Temporel), en attirant une audience globale estimée entre 200 et 400 étudiants (Mesurable). La réussite sera mesurée par le nombre de joueurs connectés au Kahoot et le nombre d'inscrits au tirage au sort.

Dans un premier temps, il faut savoir qu'on a réfléchi à différents types d'événements. On a tout d'abord pensé à faire une rencontre directement dans l'amphi de l'iut. Cette idée s'est articulée autour d'un webinaire, car nous voulions vraiment rendre accessible l'événement à l'ensemble de l'université. C'est-à-dire à l'ensemble des campus (villetaneuse, bobigny...). Mais sachant qu'on manquera de visibilité, nous avons abandonné cette idée .

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers un événement de qualité directement fait au sein de l'espace forum. Toujours avec l'idée de faciliter l'accessibilité à l'événement pour celles et ceux qui sont éloignés, nous avons songé à faire une vidéo essentiellement pour Youtube. Le problème avec cette vidéo, c'est que nous risquons de trop nous éparpiller en incluant d'autres parties prenantes négligeable comme des personnes venant du monde entier. Même si cela permettrait de redorer l'image de l'université, l'impact que la vidéo aura ne reflètera pas les efforts qui pourraient être fait pour la vidéo. On le remarque aux statistiques de la chaîne youtube qui ne sont pas énormes.

C'est pour cela qu'on va opter pour du simple et de la qualité. S'installer au sein du forum sans pour autant filmer est intéressant. Nous sommes au début de notre réflexion. Peut être qu'inciter les étudiants/enseignants avec des lots possibles à gagner rien qu'en répondant correctement à une dizaine de questions permettrait d'attirer tout le monde. En soit, notre but est d'organiser un événement permettant de sensibiliser les étudiant et plus dans leurs pratiques interne sur les enjeux du numérique responsable avant la date du Jeudi 14 mai 2026 .

En complément de notre objectif principal, nous avons identifié des objectifs secondaires qui renforcent la valeur ajoutée et l'impact du projet :

Le premier objectif concerne le rayonnement et l'image de marque de l'université. Nous cherchons à bonifier l'image de l'institution en créant une visibilité réelle et concrète sur le campus. L'enjeu est de dépasser une simple communication digitale parfois invisible pour ancrer l'événement dans le quotidien des étudiants. Pour maximiser cet impact, nous pourrions impliquer les associations étudiantes dans la diffusion afin que l'événement soit perçu comme une initiative communautaire et non seulement administrative.

Le second objectif est d'ordre comportemental : il s'agit de transformer la sensibilisation en une adoption réelle de bonnes pratiques. Le but est que les participants ne soient pas seulement spectateurs, mais qu'ils deviennent des acteurs responsables de leurs propres usages numériques.

B - Le livrable

L'une des démarches principales qui organisera notre pilotage tout au long du projet pour cet événement du jeudi 14 mai se trouve dans l'outil qui est le livrable. Cet outil est selon sa définition un résultat concret et vérifiable qui est produit par le projet et servant à prouver l'atteinte d'un objectif .

C'est pourquoi nous avons séparé ce livrable en deux étapes , le livrable principal qui représentera le résultat final de notre projet de pilotage et enfin celui intermédiaire qui lui , sert à la préparation du matériel technique et audiovisuel indispensable au bon fonctionnement de l'événement .

Le livrable principal s'articule autour de l'événement du jeudi 14 mai et plus particulièrement sur la tenue de celui-ci au sein du hall de l'IUT en accord avec les différentes directions de l'établissement .

Concernant les livrables intermédiaires nous allons d'autant plus nous axer sur le matériel qui servira au bon fonctionnement de notre livrable principal .En commençant par notre premier livrable intermédiaire qui concerne les affiches afin de promouvoir et de mettre au courant de l'événement ainsi que le mail d'invitation officiel envoyé à l'ensemble de la communauté universitaire. Ces éléments seront nos premiers pas pour ancrer l'ensemble de notre projet de pilotage. Des adresses mails qui sont d'ailleurs accessibles, directement sur la liste de diffusion sur l'ent.

(+ livrable intermédiaire concernant les validations administrative)

IV - Acteur du projet , organisation et gouvernance

A - les différents acteurs

1) Maîtrise d'ouvrage - MOA

Notre Projet de Pilotage en faveur de la journée du Numérique responsable repose sur la clarification des différents acteurs du projet . Sans quoi, de nombreux projets échouent dû à une ambiguïté des rôles .

C'est pourquoi nous allons définir ici le Maître d'ouvrage, représenté dans notre projet par la Direction de l'IUT . Son but est avant tout d'exprimer ses responsabilités sur les questions du « quoi » et du « pourquoi » . Sur cette démarche , la Direction de l'IUT exprime le besoin et définit les objectifs qui encadreront notre pilotage .

La MOA a aussi pour responsabilité de fixer les grandes contraintes et de valider les résultats du projet à chaque étape d'avancement du projet . Enfin , il est de même à préciser que la MOA ne s'occupe pas de l'exécution technique du projet mais bien de veiller à ce que le projet porte les valeurs attendues .

2) Maîtrise d'oeuvre - MOE

En tant que Maîtrise d'œuvre (MOE), notre binôme assure le pilotage opérationnel aux côtés de l'intervenant (l'animateur) et des spécialistes techniques. Notre responsabilité porte exclusivement sur le « comment » : nous avons la charge de transformer les attentes stratégiques en une solution concrète et fonctionnelle pour la journée du 14 mai.

Dans cette mission, la MOE conçoit les solutions adaptées et organise méthodiquement la réalisation des différentes phases. Nous coordonnons les ressources et mettons en œuvre le projet de manière à ce que chaque action (ateliers, conférences, logistique) s'articule logiquement avec les autres, malgré l'absence de lien hiérarchique avec les intervenants.

Enfin, notre rôle est de garantir le strict respect des contraintes imposées par le commanditaire. En pilotant l'exécution, nous veillons à ce que les choix techniques et organisationnels restent alignés avec l'enveloppe budgétaire et les délais de validation, assurant ainsi la viabilité du projet face à l'équilibre fondamental entre la Qualité, les Coûts et les Délais .

3) Equipe de Projet

Passons maintenant à un acteur clé à la réalisation du projet , l'Équipe de Projet . Son objectif principal est de travailler efficacement pour livrer un produit qui satisfait le client .

L'atout principal de notre équipe de projet se trouve dans le regroupement de plusieurs compétences qui , mises en concordance font de cette qualification une harmonie de membres qui se complètent pour satisfaire dans les délais leur charge mandatée .

4) Chef de Projet

En tant que chefs de projet, nous sommes les premiers responsables des résultats du projet. Notre mission n'est pas seulement d'exécuter des tâches, mais de garantir que l'événement final réponde aux attentes de l'université tout en respectant les contraintes de temps et de budget.

Pour cela, nous avons la charge de définir les objectifs du projet. Nous traduisons le besoin global de sensibilisation en buts concrets et mesurables, afin de donner une direction claire à toutes les actions qui seront entreprises.

Enfin, notre rôle est de développer la planification. Nous organisons le déroulement du projet dans le temps, en structurant les étapes clés et en anticipant les besoins matériels et humains pour que l'événement soit prêt pour le 14 mai.

B - Organisation

L'étape d'organisation est une étape centrale pour notre pilotage de projet. En effet , le bon déroulement de la journée du jeudi 14 mai ne dépend pas seulement des aspects techniques . Il est d'autant plus vrai que de nombreux projets échouent non pas par manque de compétences, mais causés par des failles organisationnelles telles qu'une ambiguïté des rôles , des décisions non assumées , des validations tardives ou bien des conflits de responsabilités . Cela implique qu'un projet mal organisé est un projet ingouvernable .

Pour cela, il est de mise de comprendre qu'une organisation de projet n'est pas une hiérarchisation de celui-ci , un projet ne fonctionne pas comme une organisation classique. De plus , l'équipe projet définie n'a pas toujours d'autorité hiérarchique . Pour ce qui est du chef de projet, il est préférable de préciser qu'il coordonne plus qu'il ne commande . Toutes ces distinctions font que la gestion de projet et donc notre mission de pilotage repose sur la coordination et non sur une autorité.

Enfin , les rôles de chacun comptent un ensemble de responsabilités au sein du projet qui permettent des attentes claires et servent à bien définir un périmètre. Précisons qu'un rôle peut être porté par plusieurs individus à la fois . L'ensemble de ces règles préalablement construites vont guider notre pilotage du projet vers la réussite de cette journée du jeudi 14 mai .

C - Gouvernance

La gouvernance représente l'ensemble des règles qui encadrent la prise de décision au sein du projet. Elle définit précisément les circuits de validation (qui a le pouvoir de valider quoi) et les modalités de pilotage (comment nous suivons l'avancée du projet). En clarifiant la répartition des pouvoirs entre la direction (MOA) et notre binôme (MOE), la gouvernance permet de structurer chaque étape de l'organisation.

Il est indispensable d'établir cette gouvernance pour protéger le projet. Sans règles claires, les décisions sont souvent retardées et les conflits entre les acteurs se multiplient. Cela évite que le projet ne dérive (qu'il s'éloigne de son objectif initial) ou que les responsabilités ne deviennent floues. En résumé, une bonne gouvernance garantit que chacun sait quel est son rôle, ce qui sécurise la réussite de notre événement.

V - Répartition des rôles et responsabilité (RACI)

Pour structurer l'organisation de notre événement sans avancer à l'aveugle, nous avons élaboré une matrice RACI. Cet outil nous permet de cartographier, visualiser l'ensemble des rôles et des responsabilités de chaque acteur autour de nos différents livrables. Comme nous l'avons appris, la matrice RACI est avant tout un outil de clarification indispensable pour éviter les malentendus au sein du projet, et non une fin en soi. Elle se divise en quatre niveaux d'implication précis. Le rôle "Responsable ou Responsable" désigne la personne ou le groupe qui réalise concrètement la tâche. Le rôle "Accountable" correspond au responsable final du résultat, c'est-à-dire la personne qui possède l'autorité pour prendre la décision et valider le travail. Le rôle "Consulted/Consultant" représente les acteurs sollicités pour donner un avis ou une expertise avant une prise de décision. Enfin, le rôle "Informed/à informer" concerne les personnes qui ne participent pas à la tâche mais qui doivent être tenues au courant de son avancement.

Dans l'élaboration de notre tableau, nous avons appliqué une règle théorique fondamentale, il ne doit y avoir qu'un seul décideur final, et donc un seul "Accountable"


par ligne d'activité, afin d'éviter tout conflit de validation. Par exemple, pour la conception de nos affiches et de nos Roll-ups, nous sommes les "Responsables" car nous créons nous-mêmes les visuels. En revanche, c'est le Service Communication de l'université qui détient le "Accountable", car il a le pouvoir exclusif de valider ces supports au regard de la charte graphique de l'IUT. Cette séparation claire des rôles nous permet de savoir exactement à qui nous adresser pour obtenir les validations nécessaires et ainsi protéger les délais de notre projet.

Activité (Tâches / Livrables)	Étudiants/Professeurs	Nous (MOE)	Direction (MOA)	Intervenant	Installateurs	Service Com	Service Logistique
Cadrage et validation du budget		R	A			C	C
Recherche et choix de l'intervenant		R	A	C		I	I
Réservation de la place (Hall)		R	I	I	I		A
Conception des affiches et Roll-ups		R	I			C	
Validation finale des visuels		I	C	I		A	
Mise en place des affiches (J-30)		R		I		I	I
Achat des 10 lots de récompense		R	I	C		C	I
Création du quiz (Kahoot)		R	I	C		C	I
Installation du stand (Jour J)		A	I	C	R	I	C
Animation de l'événement	I	A	I	R		I	I
Tirage au sort et remise des lots	I	A	C	I		I	I

VI - Découpage du projet en tâches (WBS)

WBS (Work Breakdown Structure) est un outil servant à la décomposition hiérarchique du projet Orienté vers les livrables et indépendant du temps et de ressources . Cet outil nous guide vers la compréhension et l'appréhension de notre pilotage de projet . La logique de décomposition se suit sous les étapes suivantes : livrable majeur ,puis sous-livrable ,puis en tâche et éventuellement en sous-tâche . En effet, chaque niveau de notre structure apporte plus de précision sur le pilotage du projet . La WBS permet de répartir le travail tout en clarifiant les responsabilités de chaque acteur du projet . Il alimente la matrice RACI et rend visible les dépendance .

notre WBS:

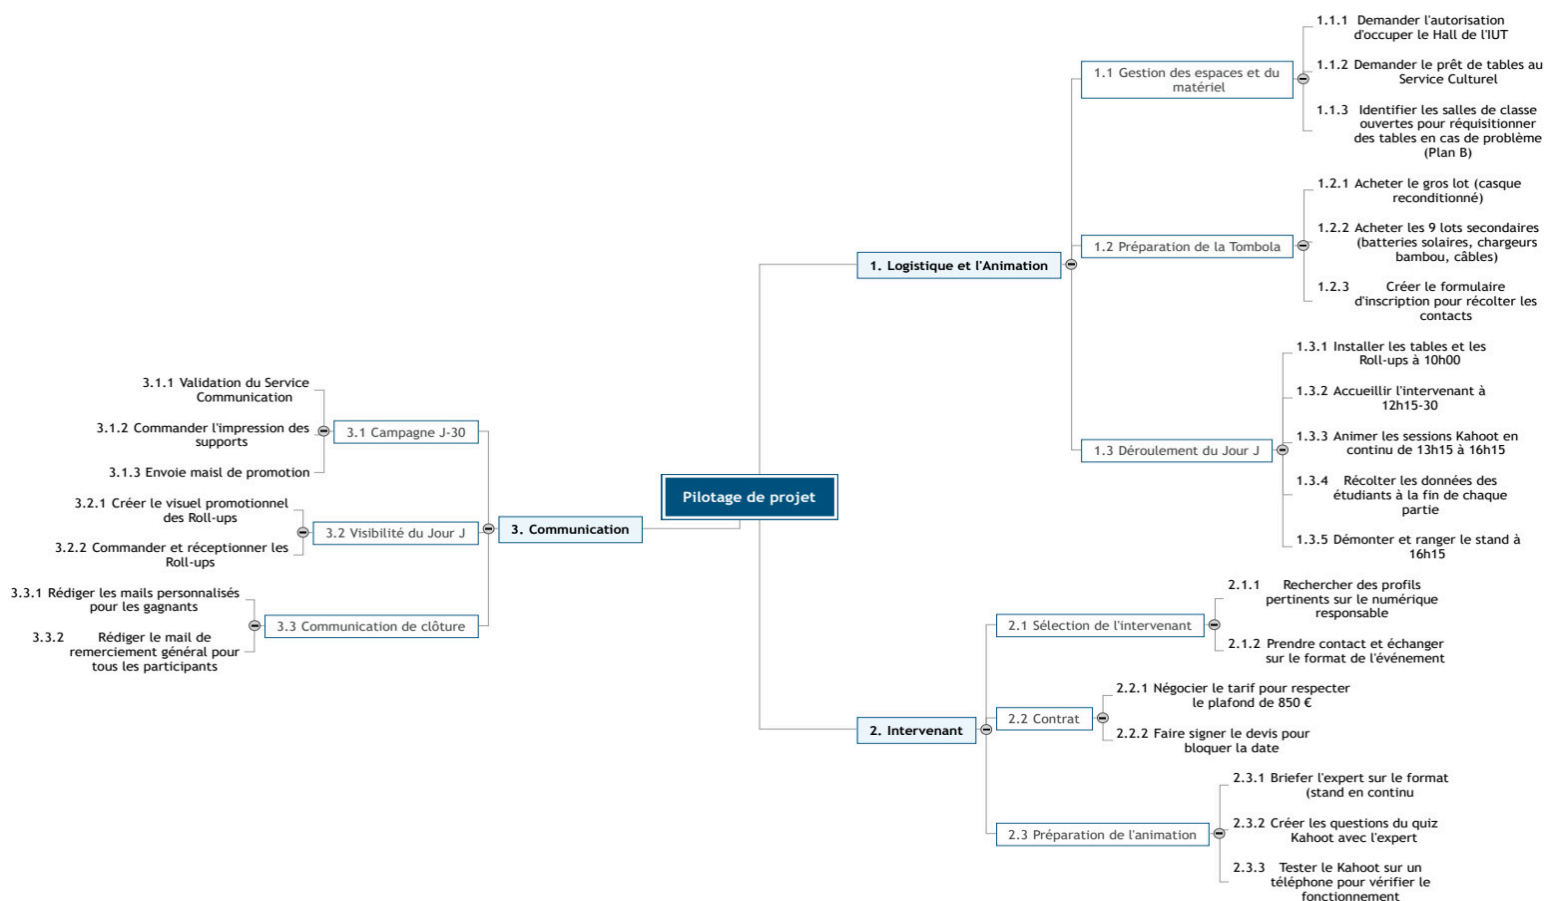

VII - Planification du projet et dépendances

La planification et les dépendances de notre projet sont une étape cruciale du pilotage puisqu'elle est au cœur même de ce qui rend notre projet pilotable. En effet, sans la préparation en amont de notre planification, le projet peut rencontrer plusieurs problèmes tels que des tâches qui s'empilent, des retards qui s'accumulent ou encore des conflits qui peuvent apparaître au sein de notre équipe. Toutes ces contraintes rendent notre pilotage de la journée du 14 mai ingouvernable.

C'est pourquoi la planification ne consiste pas seulement en une prévision et estimations de ce qui pourrait arriver, mais bien à décider dans quel ordre agir. Cela fait de la planification une prise de décision primordiale qui, alliée à des outils clés, fait d'elle une source imparable.

Concernant ces outils, la planification se doit d'intégrer pour son bon fonctionnement des éléments tels que des objectifs clairs, des livrables identifiés, un périmètre bien structuré et enfin notre WBS (Work Breakdown Structure) construit auparavant .

A - Qu'est ce qu'une dépendance ?

Une dépendance signifie qu'une tâche ne peut tout simplement pas commencer sans qu'une autre ne soit préalablement terminée. Cela se produit par exemple lorsqu'une validation officielle conditionne le lancement d'une nouvelle action, ou encore lorsqu'une ressource matérielle ou humaine doit être partagée. L'identification de ces liens est cruciale car ce sont les dépendances qui structurent véritablement notre planning et donnent un sens logique à l'enchaînement de nos actions.

Dans l'organisation de notre événement, nous avons identifié les trois grands types de dépendances vus en cours. Tout d'abord, nous avons des dépendances logiques, qui respectent l'ordre naturel des choses. Par exemple, nous ne pouvons pas procéder au tirage au sort des lots avant d'avoir récolté les participations des étudiants lors du Kahoot. Ensuite, nous faisons face à des dépendances organisationnelles, qui sont strictement liées aux validations et aux décisions. C'est le cas pour notre communication : l'impression de nos Roll-ups est totalement bloquée tant que le Service Communication de l'université n'a pas validé notre visuel. Enfin, nous devons gérer des dépendances de ressources, car nos moyens matériels sont limités. Par exemple, l'installation complète de notre stand le jour J dépend directement de la disponibilité des tables prêtées par le Service Culturel le matin même.

B - Tâches séquentielle et tâches parallèles

La planification de notre événement du jeudi 14 mai doit être pilotée de la façon la plus optimisée c'est pourquoi nous avons séparé en deux grandes sous-parties les tâches .

D'un côté, nous avons les tâches dites séquentielles qui ont pour contrainte d'être suivies dans un ordre prédéfini pour la bonne mise en œuvre du projet . Nous avons notamment défini des tâches comme séquentielles grâce au schéma WBS . Nous avons, dans l'axe de communication des tâches telles que la distribution de flyers qui ne peut être effectuée sans être précédée par la phase de conception des flyers . De même, la diffusion du mail ne peut être faite sans la rédaction de celui-ci . Concernant l'axe des derniers préparatifs, la vérification de la décoration doit être préalablement précédée par l'aménagement du stand dans le hall .

D'un autre côté, la seconde grande famille de tâches est celle dite parallèle et contrairement aux tâches séquentielles, celles parallèles peuvent être menées en même temps pour la mise en œuvre du projet . Il est d'autant plus important de pouvoir identifier le parallélisme puisqu'il peut réduire nos délais . De ce côté, les tâches parallèles identifiées par nos soins sont par exemple la distribution des flyers/supports et la diffusion du mail publicitaire/promotionnel qui peuvent être tenues en parallèle ou encore une fois dans l'axe des derniers préparatifs la vérification de l'équipement et la vérification de la décoration (rolls-up) peuvent être tenues en parallèle .


C- Les jalons de notre projet

En gestion de projet, un jalon représente une étape clé qui marque un moment décisif dans notre planification. Contrairement à une tâche de travail classique, un jalon ne consomme pas de temps. Il correspond le plus souvent à la production finale d'un livrable ou à une validation officielle par les décideurs. Dans notre organisation, ces repères sont fondamentaux car ils structurent tout le suivi de notre projet, nous évitant de nous perdre dans les détails quotidiens.

L'utilisation de ces jalons nous donne les moyens de vérifier concrètement notre avancement, d'anticiper les éventuelles dérives de notre planning et de sécuriser nos décisions avant de passer à l'étape suivante. Comme l'indique la théorie de la gestion de projet, un projet sans jalons avancerait totalement à l'aveugle. Pour l'organisation de notre journée de sensibilisation, nous avons donc défini trois jalons principaux. Le premier jalon est le feu vert officiel de la Direction, qui valide le lancement de nos actions. Le deuxième jalon est la signature du devis de notre expert (blocage de la date), qui sécurise notre événement principal. Enfin, le troisième jalon correspond au

début effectif de notre visibilité, marqué par l'affichage de notre campagne dans l'IUT un mois avant l'événement.

Diagramme de GANTT

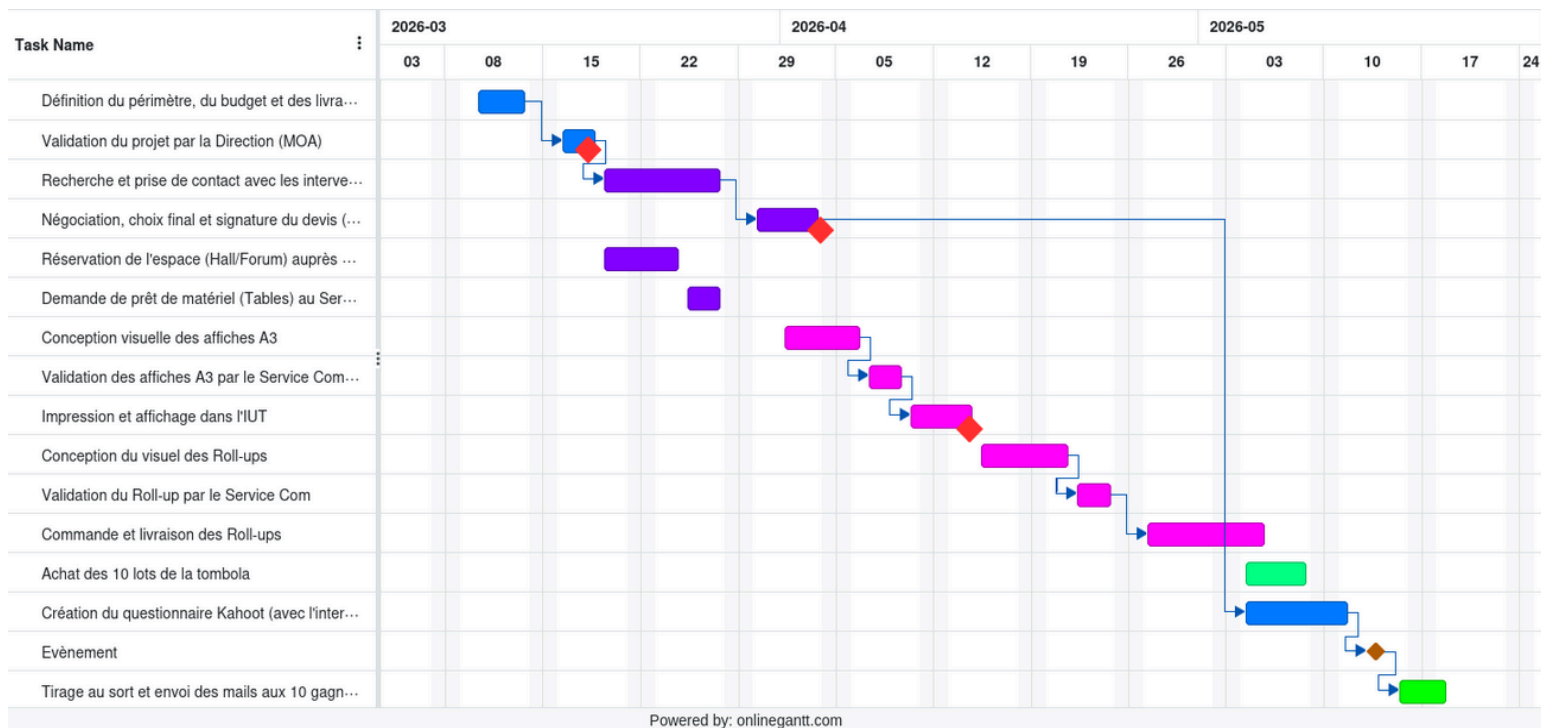

Lors du pilotage de l'événement du jeudi 14 mai en faveur du numérique responsable, nous avons utilisé plusieurs outils qui se complètent pour avoir une meilleure gestion de notre projet et pouvoir guider notre pilotage tout au long de celui-ci. Par ailleurs, notre pilotage a mis en œuvre l'utilisation de l'outil qu'est le diagramme de Gantt. Il nous a permis de coordonner nos tâches dans le temps et de pouvoir visualiser les dépendances précédemment définies. Le diagramme de Gantt permet de montrer les chevauchements par le biais des tâches dites en parallèle, il est pour cela un outil précieux à la communication de notre projet.

Cependant, il faut préciser que le diagramme de Gantt a ses propres limites et reste un outil qui doit seulement nous aider lors de notre pilotage et non remplacer un pan (partie) de celui-ci. En effet, le diagramme de Gantt ne met pas en relation les conflits humains, les risques ou encore les arbitrages budgétaires de notre enveloppe de 2 000 euros. Le diagramme de Gantt est un outil précieux à notre pilotage, mais ne se suffit pas à lui-même pour pouvoir garantir la gouvernance de notre projet.

D- Le chemin critique

Dans la gestion de notre projet, le chemin critique correspond à la séquence de tâches qui s'enchaînent obligatoirement et qui détermine la durée minimale de notre organisation. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale de notre planning. La règle fondamentale de ce concept est simple : si une seule étape située sur ce chemin critique prend du retard, c'est l'intégralité du projet qui est inévitablement retardée. Il n'y a aucune marge de manœuvre sur ces tâches précises.

Pour notre événement du 14 mai, nous avons identifié plusieurs tâches sur ce chemin critique. Par exemple, la conception de nos Roll-ups, leur validation par le Service Communication, puis la commande chez l'imprimeur(). font partie de notre chemin critique. Si le Service Communication met trop de temps à valider notre visuel, la commande sera retardée, et nous risquons de ne pas recevoir nos supports (ex : rolls-up) pour le jour de l'événement. C'est précisément pour protéger ce chemin critique, et éviter que tout le projet ne prenne du retard, que nous avons anticipé un plan de secours visuel prêt à être imprimé immédiatement en cas de refus. En mettant sur nos rolls-up seulement l'affiche promotionnel déjà validé par la direction de l'UIT, mais pas celle qui est captivante avec les lots à gagner.

VIII - Budget prévisionnel et arbitrages réalisés

Pour gérer ce projet, il est important de différencier le budget de la comptabilité. La comptabilité est une analyse *a posteriori* (une fois que l'argent est dépensé). À l'inverse, le budget de projet est un outil prévisionnel : il sert à anticiper, décider et faire des choix.

Pour notre événement, la MOA nous a imposé des ressources limitées avec une enveloppe stricte de 2 000 €. En gestion de projet, toute décision doit maintenir l'équilibre entre la Qualité, le Coût et les Délais. Notre objectif est d'offrir la meilleure qualité d'événement possible le 14 mai, sans jamais dépasser ce coût maximal.

A- Notre budget ?

Un bon budget ne s'invente pas , il s'appuie directement sur le WBS (le découpage des tâches), le planning et les ressources mobilisées. Nous avons donc chiffré chaque grand livrable pour arriver à la répartition suivante (sur 2 000€) :

- Prestation externe (850,00 €) : Rémunération et déplacement de notre intervenant expert.
- Récompenses du Kahoot (498,60 €) : Achat de 10 lots High-Tech éco-responsables pour les gagnants.
- Communication Jour J (206,40 €) : Achat de 2 Roll-ups réutilisables pour attirer le public.

- Communication J-30 (45,00 €) : Impression de 30 affiches A3 sur papier recyclé.
- Marge de sécurité (400,00 €) : Réserve financière (20 % du budget total) pour gérer les imprévus.

B - Réflexion

Dans ce projet, comme dans n'importe quel projet, les ressources sont limitées et chaque choix a un coût. La règle est simple : augmenter le périmètre implique d'augmenter le budget, et réduire le budget impose de réduire le périmètre ou la qualité. Le budget impose donc de choisir ce qui est prioritaire, ce qui est réduit, et ce qui est supprimé. C'est ce qu'on appelle faire des arbitrages.

Voici notre chemin de raisonnement qui nous a conduits à cette répartition détaillée :

La suppression de la collation (notre choix le plus fort) : Au départ, nous pensions proposer un buffet. Cependant, nous avons décidé de le supprimer totalement. D'une part, cela présentait un risque sanitaire trop important (gestion complexe des allergies alimentaires des étudiants). D'autre part, ce poste de dépense aurait consommé une grande partie de nos 2 000 €.

La création d'une grande marge de sécurité : L'argent économisé sur le buffet n'a pas été gaspillé. Nous l'avons utilisé pour sécuriser le projet en créant une marge de sécurité de 400 €. Un budget de projet étant toujours incertain, cette somme nous permet d'anticiper n'importe quel problème matériel de dernière minute sans paniquer.

Privilégier la Qualité (L'intervenant et les lots) : Pour attirer entre 200 et 400 personnes, nous avons défini deux priorités absolues. Premièrement, nous allouons 850 € à un expert, car c'est son niveau qui garantira la crédibilité et la réussite de la journée. Deuxièmement, plutôt que d'acheter des centaines de petits "goodies" (comme beaucoup d'autres groupes ont voulu faire) en plastique très peu écologiques, nous avons arbitré pour l'achat de seulement 10 cadeaux, mais de grande qualité (pour une enveloppe totale d'environ 500 €). Pour créer une vraie motivation lors du quiz, nous avons hiérarchisé ces lots :

- Le 1er prix (le gros lot) : Un casque audio sans fil reconditionné (env. 150€).
- Du 2eme au 3eme prix: Des batteries externes à charge solaire (environ 65€ l'unité).
- Du 4eme au 6eme prix: Des stations de charge pour téléphone en bois de bambou (environ 35 € l'unité).
- Du 7eme au 10eme prix : câbles de charge multi-embouts fabriqués en plastique recyclé (environ 28 € l'unité).

Une communication de Qualité et maîtrisée : Pour garantir la visibilité de l'événement sans exploser le budget, nous avons ciblé nos supports. Nous finançons l'impression de 30 affiches A3 sur papier recyclé (45 €) pour lancer une campagne publicitaire un

mois avant l'événement (à J-30). Concernant ces papier recyclées, on s'est renseigné sur le site de Imprim'vert. C'est totalement en accord avec les principes enseigner projet. Ensuite, pour le Jour J, nous investissons dans deux Roll-ups personnalisables (206,40 €). C'est un coût important, mais ces grands panneaux visuels sont indispensables pour capter l'attention des étudiants dans le hall. De plus, ils sont réutilisables, ce qui limite le gaspillage.

L'optimisation logistique (Coût 0 €) : Enfin, pour le matériel (les tables du stand), nous avons décidé de nous appuyer à 100 % sur les ressources internes de l'IUT (Service culturel ou salles de classe). Cela nous permet de maintenir le coût à 0 €.

IX - Analyse des risques et modalités de suivi

L'analyse des risques et les modalités de suivi sont des constantes importantes pour notre pilotage de projet du 14 mai . En effet, le risque est un aléa, un événement indésirable dont l'apparition n'est pas certaine, ayant pour conséquence la possibilité que le projet n'aboutisse pas conformément aux objectifs tels que la date d'achèvement, le coût, les spécifications qu'elles soient techniques, de qualité, de performance, de fiabilité ou encore d'autres aléas qui pourraient impacter directement l'image de l'entreprise, son environnement, son juridique ou bien son social .

Le risque peut avoir un impact négatif ou positif . Par ailleurs, il n'est pas un problème mais une possibilité . De ce fait, nous distinguons plusieurs familles de risques : les risques organisationnels (absences d'un intervenant clé a la réussite de notre projet), les risques humains(La perte de motivation), les risques financiers (manque de budget), les risques temporels (dépassement de la date de nos tâches prédéfinies).

Enfin , l'analyse des risques et des modalités de suivi vont nous permettre de pouvoir gouverner notre projet sans débordement et pouvoir livrer notre projet sans embûche. C'est pourquoi il nous faut faire la différence entre contrainte et risque . Une contrainte est restrictive, mais est connue d'avance. D'un autre côté, un risque lui , n'est jamais certain de se réaliser .

Afin de pouvoir évaluer chaque risque nous devons nous appuyer sur plusieurs méthodes et outils , à commencer par les deux caractéristiques premières du risque que sont la probabilité que le risque soit déclenché et celle de son impact dans notre projet . En effet, tous les risques ne se traitent pas de la même façon . Il nous faudra donc pouvoir évaluer les risques suivant la méthode de détection en 5 étapes :

1. Les déclencheurs : les événements ou conditions qui déclenchent le risque .

2. La nature du risque : qu'elle soit climatique, technologique, juridique ou d'autres encore.
3. L'origine du risque : les délais de livraison, le manque d'expérience des remplaçants, etc.
4. Les conséquences : retards sur le projet, coûts supplémentaires, modification des spécifications.
5. Les actions correctives : les actions préventives et curatives mises en place pour la correction de celui-ci.

Risques	Nature du Risque	Déclencheur	Origine du risque	Les Conséquence	Les Actions Correctives (Préventive et Curative)
Communication	Organisationnelle	Retard de validation des visuels par la MOA.	Manque de réactivité lors de la validation des supports .	Retard sur la conception et donc la distribution des flyers	P : Fixer une date limite de validation. C : Faire une relance ou bien contacter le supérieure direct
Invitations	Humaine	Désistement d'un intervenant ou d'un acteur clé.	Dû à une Maladie, problème de transport ou urgence.	Programme incomplet, modification de l'ordre des tâches le jour .Événement sur le numérique responsable sans réel apprentissage	P : Confirmer 48h avant et surveillance de la liste de réserve dans le cas d'un désistement. C : Remplacer par un atelier ou kahoot (fait au préalable).
Équipement	Technologique	Panne de matériel lors des tests	Matériel ou câble manquant .	Retard au lancement, impossibilité de projeter les supports lors de notre journée.	P : Test des équipements la veille et prévention d'un kit C : Utilisation du kit prévue en amont .
Participants	Humain	captation du publique faible lors de l'événement	Mauvais ciblage ou manque de promotion	Échec de l'objectif de sensibilisation, gaspillage des ressources.	P : Relances. faire des annonces orales dans toute l'université pour susciter le bouche à oreille et annoncer l'événement.
Projet Global	Financier	Dépassement du budget de 2 000 €.	Inflation des prix ou frais non prévus.	Devoir utiliser d'autres budgets ,notamment celui de la nourriture .	P : Créer un tableau de suivi budgétaire strict C : Chercher des sponsors internes ou réduire les quantités.
Jour J	Climatique	Forte chaleur ou fuite d'eau dans le hall	Conditions météo défavorables le 14 mai.	Inconfort des participants, matériel technique en danger.	P : Prévoir un plan de secours dans une salle de l'IUT ou dans un amphi C : Déplacer les stands dans une zone abritée,notamment le hall de l'IUT

Une fois les risques soutirés et analysés, il nous faut maintenant passer à une étape d'analyse de données par le phénomène qu'on nomme criticité. Celle-ci nous permettra d'avoir un œil attentif tout au long de notre mission de pilotage sur les futurs risques et de pouvoir avoir des actions de correction réactives lors de l'apparition de ceux-ci. La criticité d'un risque est un indicateur permettant de mettre en avant la probabilité d'apparition d'un risque (sa chance qu'il se produise) , sa gravité (l'importance de l'impact sur les objectifs) et enfin sa probabilité de non-détection (donc sa difficulté à identifier le dit risque à temps) . Plus la criticité est élevée, plus le risque doit être surveillé et traité en priorité. Calculée par la formule :

$$C = \text{Probabilité d'apparition} * \text{Gravité} * \text{Probabilité de non-détection}$$

Tableau AMDEC simplifié

Risques	Probabilité	Gravité	Défectabilité	Criticité (C)	Niveau de Risque
Communication (Retard de validation)	3	2	1	6	Niveau- Faible
Invitations (Désistement des intervenants)	2	3	2	12	Niveau - Moyenne
Restauration (Écart entre inscrits et présents)	3	2	2	12	Niveau - Moyenne
Équipement (Panne technique)	2	3	1	6	Niveau- Faible
Participants (Faible affluence)	2	3	3	18	Niveau - Très forte
Projet Global ,Budget	2	3	2	12	Niveau - Moyenne
Jour J , Météo	1	4	2	8	Niveau- Faible

La lecture et la compréhension de la criticité se font sous plusieurs niveaux d'alerte. En effet, à la suite des calculs de chacune des échelles nous donnant la criticité, il nous a fallu les classer pour pouvoir regrouper les niveaux de criticité afin d'améliorer notre vigilance sur certains risques de par leur niveau de criticité.

1 à 4 : criticité très faible, le projet ne devrait pas subir de conséquences significatives.

5 à 8 : criticité faible, risque maîtrisable ayant de faibles conséquences.

9 à 12 : Criticité moyenne, aura des conséquences sur les objectifs du projet.

13 à 16 : criticité forte, aura des conséquences majeures sur le projet.

17 et plus : criticité très forte, ce niveau de risque relève du maître d'œuvre qui peut décider d'interrompre le projet ou de le délocaliser.

X- Bilan prévisionnel et retour réflexif

Il nous est primordial de pouvoir conclure notre mission de pilotage sur l'événement du numérique responsable missionné par la direction de l'IUT. La clôture de notre projet n'est pas en soi une finalité du projet en lui-même, mais une phase critique qui nous permettra de nous améliorer. En effet, cette phase nous permet d'analyser, de formaliser et de pouvoir capitaliser sur cette expérience engrangée tout au long de ce projet. Elle fait de la clôture une phase à part entière du cycle de vie d'un projet.

Dans le cas contraire, la non-clôture de notre projet ne produirait aucune forme d'apprentissage et nous ferait répéter les mêmes erreurs pour nos projets futurs. La clôture est donc un bilan multidimensionnel. Elle ne se limite pas seulement au respect de notre enveloppe budgétaire de 2 000 euros ni à son achèvement à l'heure.

Les performances de notre projet se concrétisent par la qualité de nos livrables, la satisfaction des parties prenantes, mais aussi la cohérence des décisions. Cela passe par la validation de plusieurs critères, tels que la satisfaction des intervenants et des bénéficiaires, mais aussi celle de la direction de l'IUT qui nous a mandatés pour cette mission de pilotage.

C'est pourquoi nous avons structuré notre bilan autour de cinq étapes clés qui garantissent la réussite de notre mission :

Tout d'abord, nous avons validé l'atteinte des objectifs, avec pour priorité majeure celle imposée par la direction de l'IUT : la sensibilisation au numérique responsable. Cet objectif est notamment répondu par la présence de notre intervenant externe, qui garantira la crédibilité ainsi que la qualité des enseignements délivrés lors de cette journée.

La seconde étape concerne la production des livrables. Des outils tels que la WBS, le RACI, le Gantt ou encore le tableau AMDEC, sans oublier la planification rigoureuse et le budget publicitaire lié aux flyers, constituent un ensemble qui nous permettra la réalisation opérationnelle de l'évènement .

S'ensuit le respect du planning, assuré par la direction de l'IUT et défini par la journée du jeudi 14 mai 2026. Cette journée est complétée par le respect du budget, développé précédemment dans la partie « Budget prévisionnel et arbitrages réalisés ».

Enfin, la dernière étape clé de ce bilan est la gestion des risques. Celle-ci a été appuyée par des outils de pilotage comme le tableau AMDEC simplifié, la méthode des trois échelles et l'application de la formule de la criticité.

Ces cinq points clés nous ont permis de peaufiner notre pilotage de projet et de faire tendre notre gouvernance vers une amélioration continue, suivie par d'actions de correction réactives tout au long du processus.

XI - Contribution individuelle et prise de recul personnelle

Anass :

La contribution tout au long du projet s'est faite de manière répartie et équitable entre mon camarade Hamza et moi-même. Ensemble , nous avons pu mettre en œuvre des méthodes et outils divers tout en plaçant l'évènement portant sur le numérique responsable au devant de la scène . En ce qui me concerne , ma contribution principale a été fondée sur la création de la WBS . Cette décomposition hiérarchique du projet orientée vers les livrables et indépendante du temps ou des ressources , nous a permis d'avoir une meilleure vision d'ensemble . Elle a notamment mis en lumière l'imbrication des tâches et des sous-tâches qu'il ne fallait pas omettre lors de la réalisation opérationnelle .

Ma seconde contribution majeure pour la gouvernance de notre projet a été l'analyse des risques et de leurs modalités de suivi . Ce travail m'a permis de mettre en œuvre les trois échelles d'évaluation ainsi que le calcul de la criticité pour chaque niveau . Cette étape m'a d'autant plus marquée par la présence d'un risque de niveau Très fort , dont j'avais initialement sous-estimé le propre niveau de criticité . Cette prise de

conscience nous a été bénéfique pour, par la suite pouvoir réfléchir et analyser de possibles actions correctives face à ce risque .

Finalement , l'utilisation de tous ces outils et méthodes m'a montré un pan (partie) entier de l'organisation de projet , celle-ci ne se base pas simplement sur les contraintes budgétaires ou sur le rendu final dans les délais . Cette expérience m'a apporté une vision nouvelle et m'a permis d'acquérir un socle solide , réutilisable dans de futures gestions de projet à plus ou moins grande échelle , afin de garantir une gouvernance structurée lors de leur réalisation .

Hamza :

Tout au long de cette SAE, Anass et moi avons réussi à mettre en place une excellente dynamique de travail. Nous avons pris soin de répartir les tâches de manière équilibrée, tout en communiquant entre nous très régulièrement pour garantir la solidité de notre projet et de notre pilotage. De mon côté, je me suis principalement attaqué à la matrice RACI. Ce travail m'a permis de réaliser à quel point cet outil est un véritable pilier de notre organisation. J'ai compris qu'une matrice bien construite est indispensable pour assurer la cohérence de toute la suite du projet, car elle évite d'avancer à l'aveugle en définissant précisément les décideurs.

Je me suis également beaucoup intéressé à la partie budgétaire, qui s'est révélée particulièrement formatrice pour nous. Construire ce budget m'a fait prendre conscience que chaque choix d'organisation possède un poids réel et des conséquences directes. L'étape des arbitrages financiers donne toute la maturité au projet. Parallèlement, la conception du diagramme de Gantt a été une vraie leçon sur la gestion du temps. Ce planning visuel montre qu'un chef de projet doit être très réactif, car le moindre moment de procrastination peut faire dérailler tout le chemin critique et menacer les délais.

Et enfin, j'ai pu constater que les séances de travail en classe devenaient un peu moins rentables sur les dernières étapes de notre SAE, car ces phases exigeaient un temps de réflexion et de rédaction plus important. Néanmoins, le grand point positif de ces créneaux avec vous, Monsieur Isseki, était la possibilité de vous poser nos questions en direct. Sans ces moments d'échanges "priviliégiés", c'est vrai que nous avons souvent tendance à oublier nos questions en dehors des cours. En conclusion, je tenais à vous remercier pour cette SAE Très enrichissante. Elle nous a plongés directement dans les exigences du monde professionnel, et ce avec un sujet d'actualité qu'est l'écologie liée au numérique (notre domaine).
